


| azonosító | Részlet | Tevékenység neve  | Közvetlen előzmény | Kezdet     | Vége       | Időtartam |
|-----------|---------|---|--------------------|------------|------------|-----------|
| 1         | I.      | Felületrendezés munkái (Körfolyósziget)   |                    | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 0 nap     |
| 2         | I.      | Út (Szerződés) Siker u. és Kozma u. között (Körfolyósziget)   |                    | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 18 nap    |
| 3         | I.      | bontás és alapítvány munkák   | 2                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 4         | II.     | szegélyépítések   | 3                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 5         | II.     | útátellenítés - szarvát   | 4                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 6         | II.     | közvilágítás alapítvány   | 5                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 7         | II.     | 0.4 KV-os kábelkiváltás   | 6                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 7 nap     |
| 8         | I.      | BKV Vilamos felsővezetési kiváltás  | 7                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 7 nap     |
| 9         | II.     | szarvát félrehozás körfolyósziget   | 8                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 6 nap     |
| 10        | II.     | közvilágítás felújítás  | 9                  | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 11        | I.      | szarvát Újgyógy utca csatlakozás két ütemben, forgalomterelés a szarvát   | 10                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 4 nap     |
| 12        | II.     | Út (Siker u. - Siker u. között) Kozma u. szelvése, körforgalom Siker u. - Kozma u. közötti megvetés, Kozma utca temető bejárati közti megvetés és a temető bejárati út oldali behajtó | 11                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 16 nap    |
| 13        | I.      | Melekon kiváltás  | 12                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 7 nap     |
| 14        | I.      | Novonon-mei kiváltás  | 13                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 7 nap     |
| 15        | I.      | bontás, alapítvány munkák   | 14                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 16        | I.      | útátellenítés   | 15                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 17        | I.      | szegélyépítések   | 16                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 18        | I.      | közvilágítás alapítvány   | 17                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 19        | I.      | útépítés körfolyósziget   | 18                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 6 nap     |
| 20        | I.      | közvilágítás felújítás, fészkelés   | 19                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 4 nap     |
| 21        | III.    | Út (Siker u. - Újgyógy utca) Kozma u. közötti behajtó, forgalomterelés a szarvát  | 20                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 18 nap    |
| 22        | I.      | bontás és alapítvány munkák   | 21                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 6 nap     |
| 23        | I.      | szegélyépítések   | 22                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 7 nap     |
| 24        | I.      | útátellenítés   | 23                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 25        | I.      | közvilágítás alapítvány   | 24                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 26        | I.      | útburkolati rétegek   | 25                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 7 nap     |
| 27        | I.      | közvilágítás felújítás  | 26                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 4 nap     |
| 28        | I.      | közvilágítás kiváltás   | 27                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 10 nap    |
| 29        | I.      | Út (Kozma u. - Siker u. között) Siker u. átépítése (felújítás lezárás mellett)  | 28                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 10 nap    |
| 30        | I.      | bontás és alapítvány munkák   | 29                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 31        | I.      | szegélyépítések   | 30                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 32        | I.      | útátellenítés   | 31                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 33        | I.      | közvilágítás  | 32                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 34        | I.      | útburkolati rétegek   | 33                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 35        | I.      | Út (Kozma u. - Siker u. között) Siker u. átépítése (felújítás lezárás mellett)  | 34                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 10 nap    |
| 36        | I.      | bontás és alapítvány munkák   | 35                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 37        | I.      | szegélyépítések   | 36                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 38        | I.      | útátellenítés   | 37                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 39        | I.      | közvilágítás  | 38                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 40        | I.      | útburkolati rétegek   | 39                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 41        | I.      | Út (Siker u. - Kimarati szakasza felújítás)   | 40                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 6 nap     |
| 42        | I.      | bontás és alapítvány munkák   | 41                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 43        | I.      | szegélyépítések   | 42                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 44        | I.      | útátellenítés   | 43                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 1 nap     |
| 45        | I.      | közvilágítás  | 44                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 46        | I.      | útburkolati rétegek   | 45                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 47        | I.      | Út (Siker u. - Kimarati szakasza felújítás)   | 46                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 6 nap     |
| 48        | I.      | bontás és alapítvány munkák   | 47                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 49        | I.      | szegélyépítések   | 48                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 50        | I.      | útátellenítés   | 49                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 1 nap     |
| 51        | I.      | közvilágítás  | 50                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 52        | I.      | útburkolati rétegek   | 51                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 53        | I.      | VIII. útem (Férfiútem forgalom felújítása mellett)  | 52                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 54        | I.      | korlátok behúása, teljes felületen  | 53                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 55        | I.      | forgalomtechnikai jelek felújítása  | 54                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 2 nap     |
| 56        | I.      | Egyéb a forgalomterelés nem igénylő tevékenységek   | 55                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 30 nap    |
| 57        | I.      | Körforgalom közepének kialakítása   | 56                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 10 nap    |
| 58        | I.      | Körforgalomhoz kapcsolódó egyéb készlet   | 57                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 10 nap    |
| 59        | I.      | Keretkapát és járdák építése  | 58                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 20 nap    |
| 60        | I.      | I. RÉSZHATÁRODÓ - ideiglenes forgalombehelyezés   | 59                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 0 nap     |
| 61        | I.      | Területrendezés   | 60                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 32 nap    |
| 62        | II.     | szarvát parkok és járdák felújítása   | 61                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 10 nap    |
| 63        | II.     | szarvát végleges forgalomtechnika   | 62                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 3 nap     |
| 64        | II.     | kerékpárutak  | 63                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 19 nap    |
| 65        | II.     | Környezetrendezés   | 64                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 14 nap    |
| 66        | II.     | Közvilágítás kiváltása  | 65                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 5 nap     |
| 67        | II.     | parkosítás  | 66                 | 12. Jun 11 | 12. Jun 11 | 14 nap    |

1. oldal

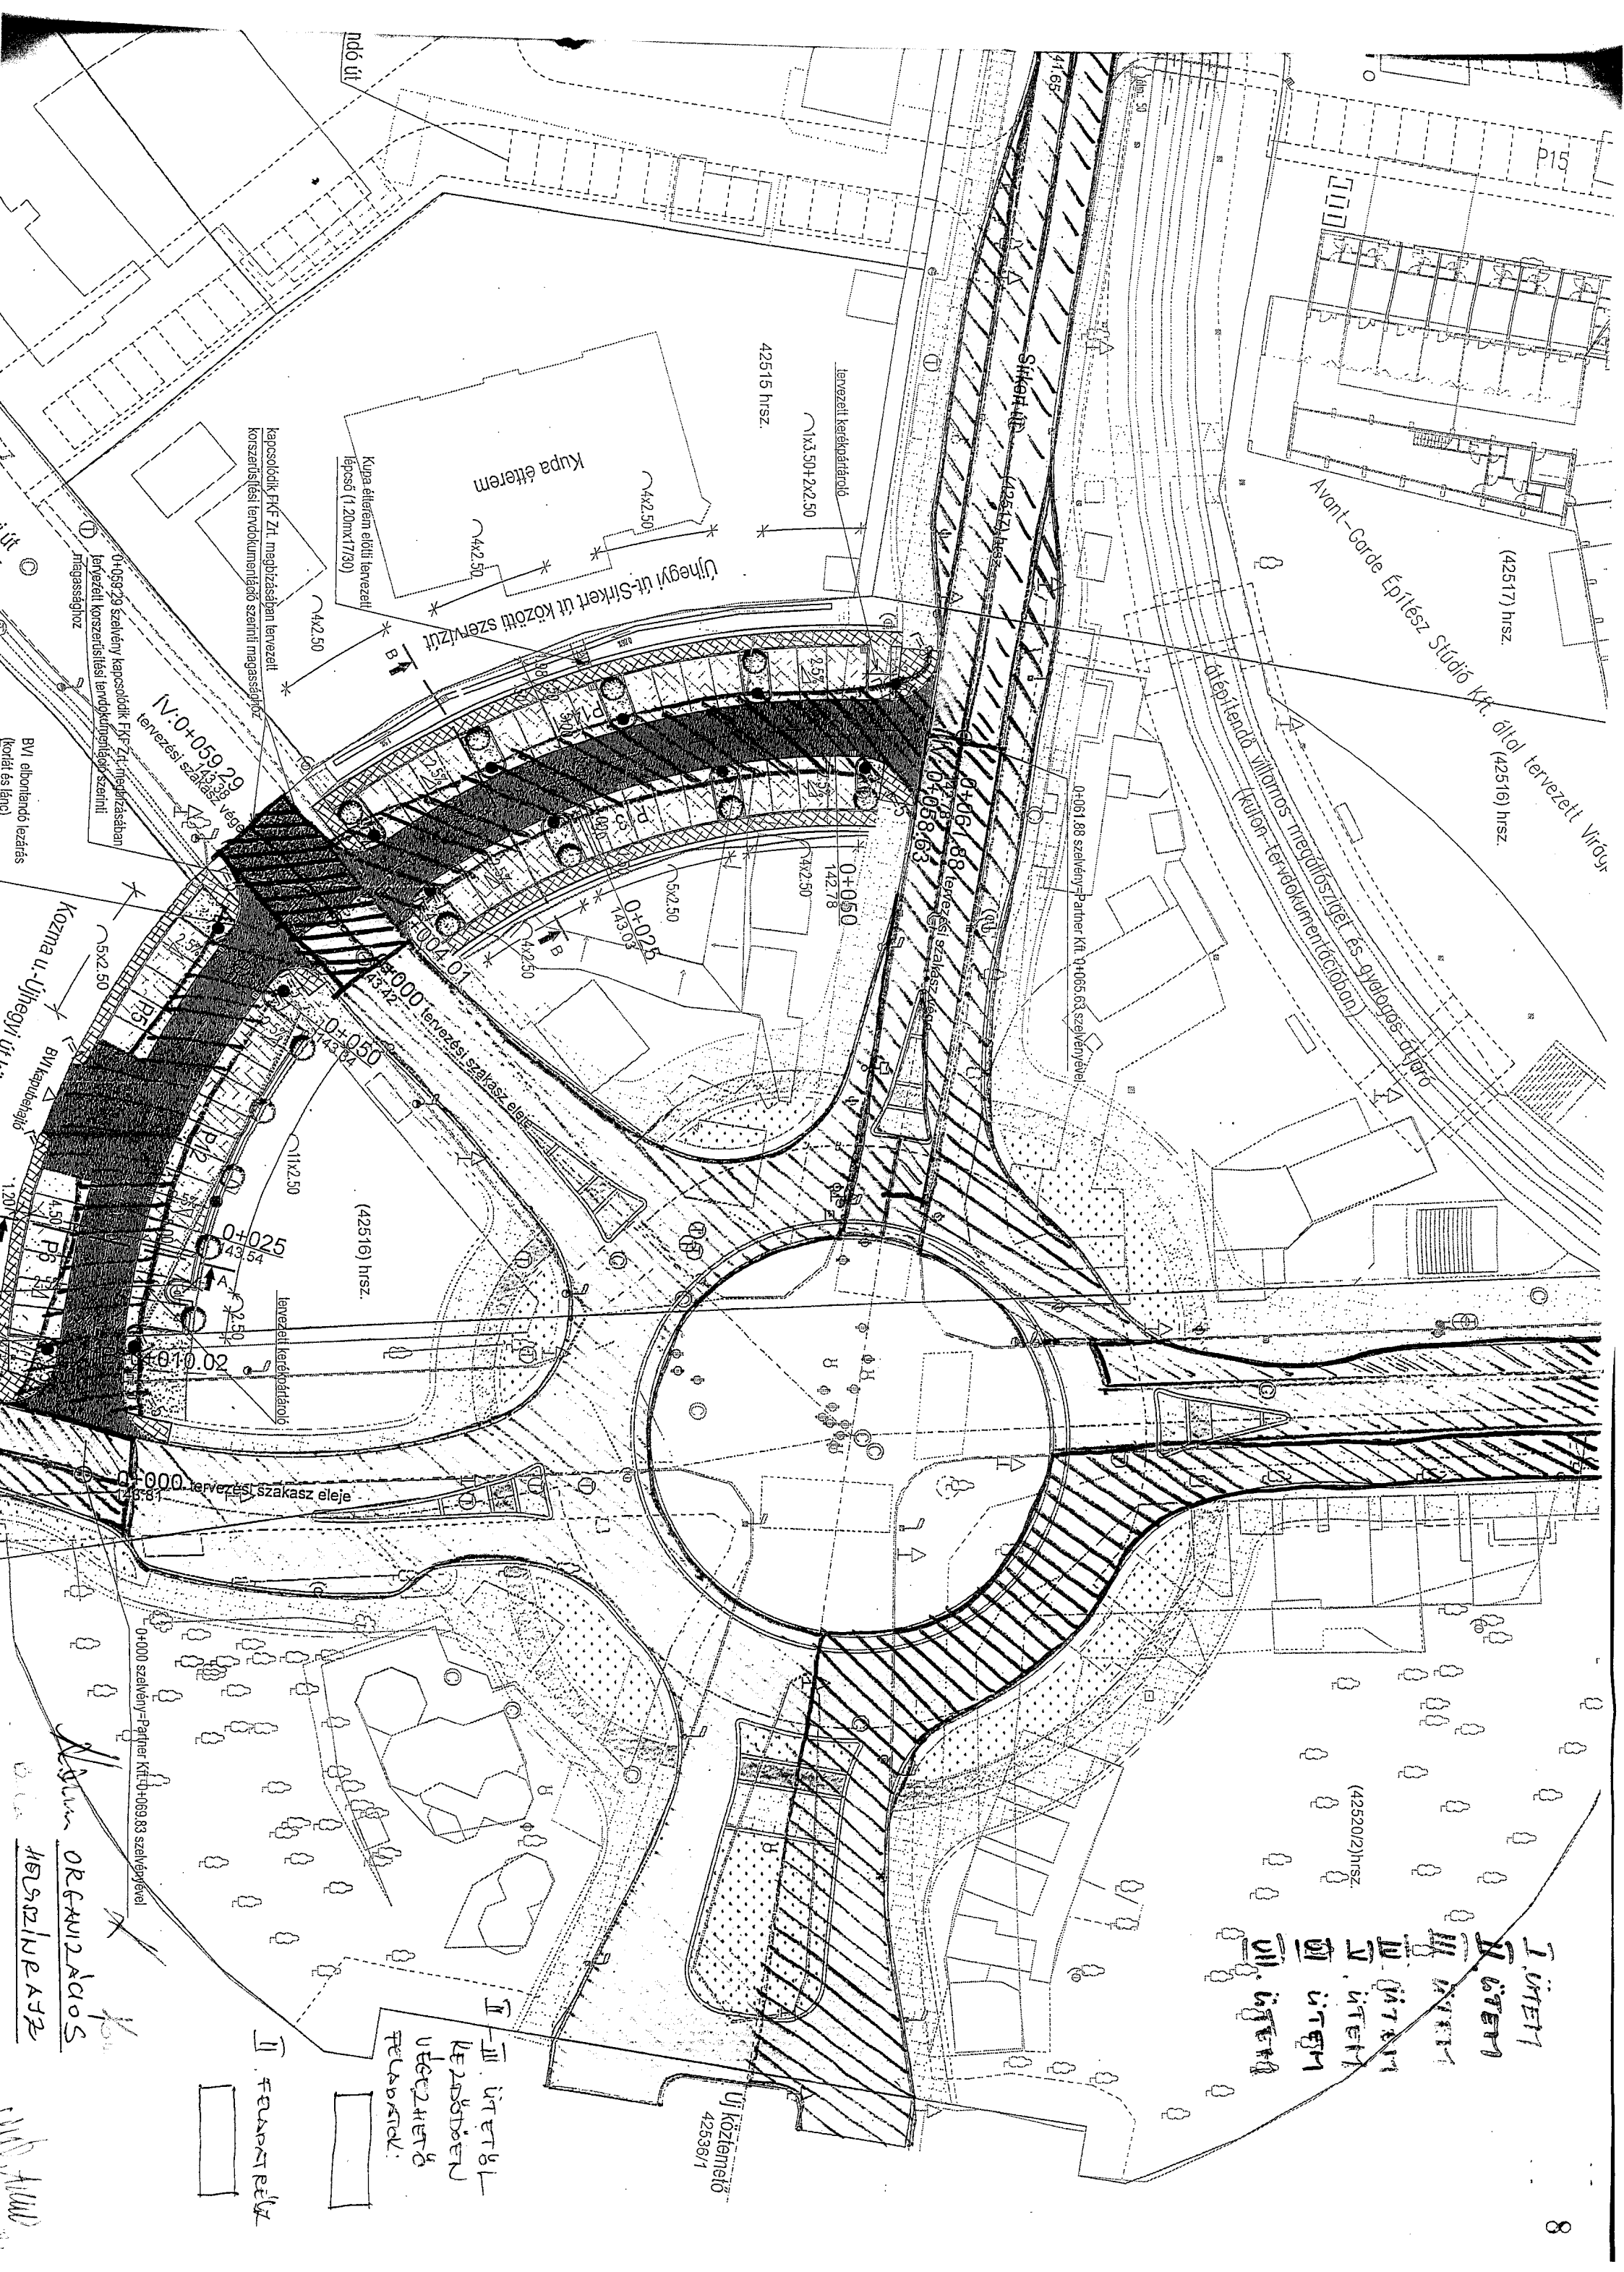

P15

(42517) hrsz.

által tervezett Virág

Avont-Corde Építész Stúdió Kft.  
(Kulcs-tervekkönyvtárban)

tervezési szakasz eleje

0+061.88 tervezési szakasz eleje

0+058.63

tervezett kerekpálya  
1x3,50+2x2,50  
42515 hrsz.

Kupa étterem  
4x2,50

Kupa étterem előtti tervezett  
lépcső (1,20mx17,30)

kapcsolódik FKE Zrt. megbízásában tervezett  
korszerűsítési tervdokumentáció szerinti magassághoz

0+059.29 szelvény kapcsolódik FKE Zrt. megbízásában  
tervezett korszerűsítési tervdokumentáció szerinti  
magassághoz

IV: 0+059.29  
tervezési szakasz eleje

0+050  
142.78

0+025  
143.03

(42516) hrsz.

0+025  
43.54

0+010.02

0+000. tervezési szakasz eleje

(42520/2) hrsz.

- I. ÜTEM
- II. ÜTEM
- III. ÜTEM
- IV. ÜTEM
- V. ÜTEM
- VI. ÜTEM
- VII. ÜTEM

Új közlekedő  
42535/1

II-III. ÜTEM  
LEJÁRÓKÉNT  
VÉGETETÉS  
FELADATOK

II. FORDULÓ

ORFŐVIZELÉSI  
TERV

MEGVALÓSÍTÁS
