




ÁTTEKINTŐ FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

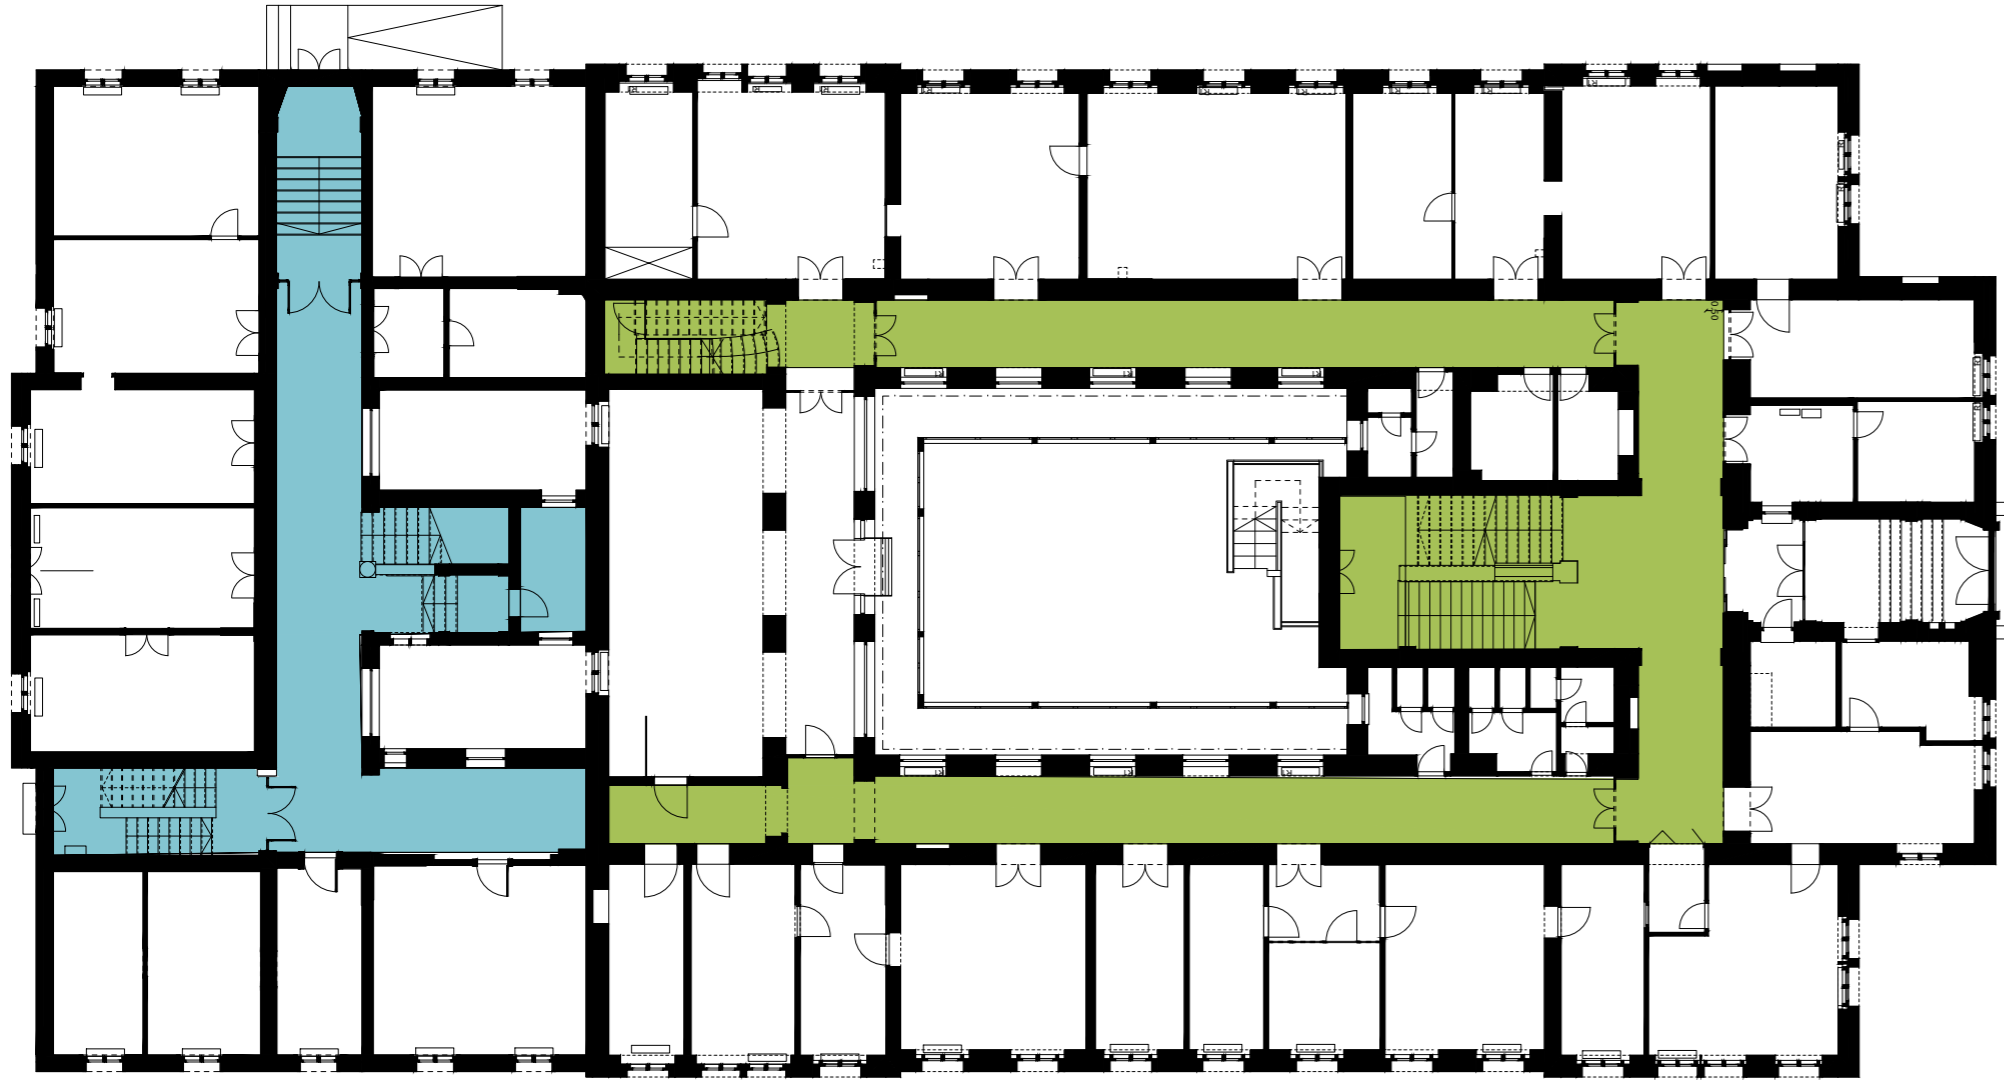

ÁTTEKINTŐ 2. EMELETI ALAPRAJZ

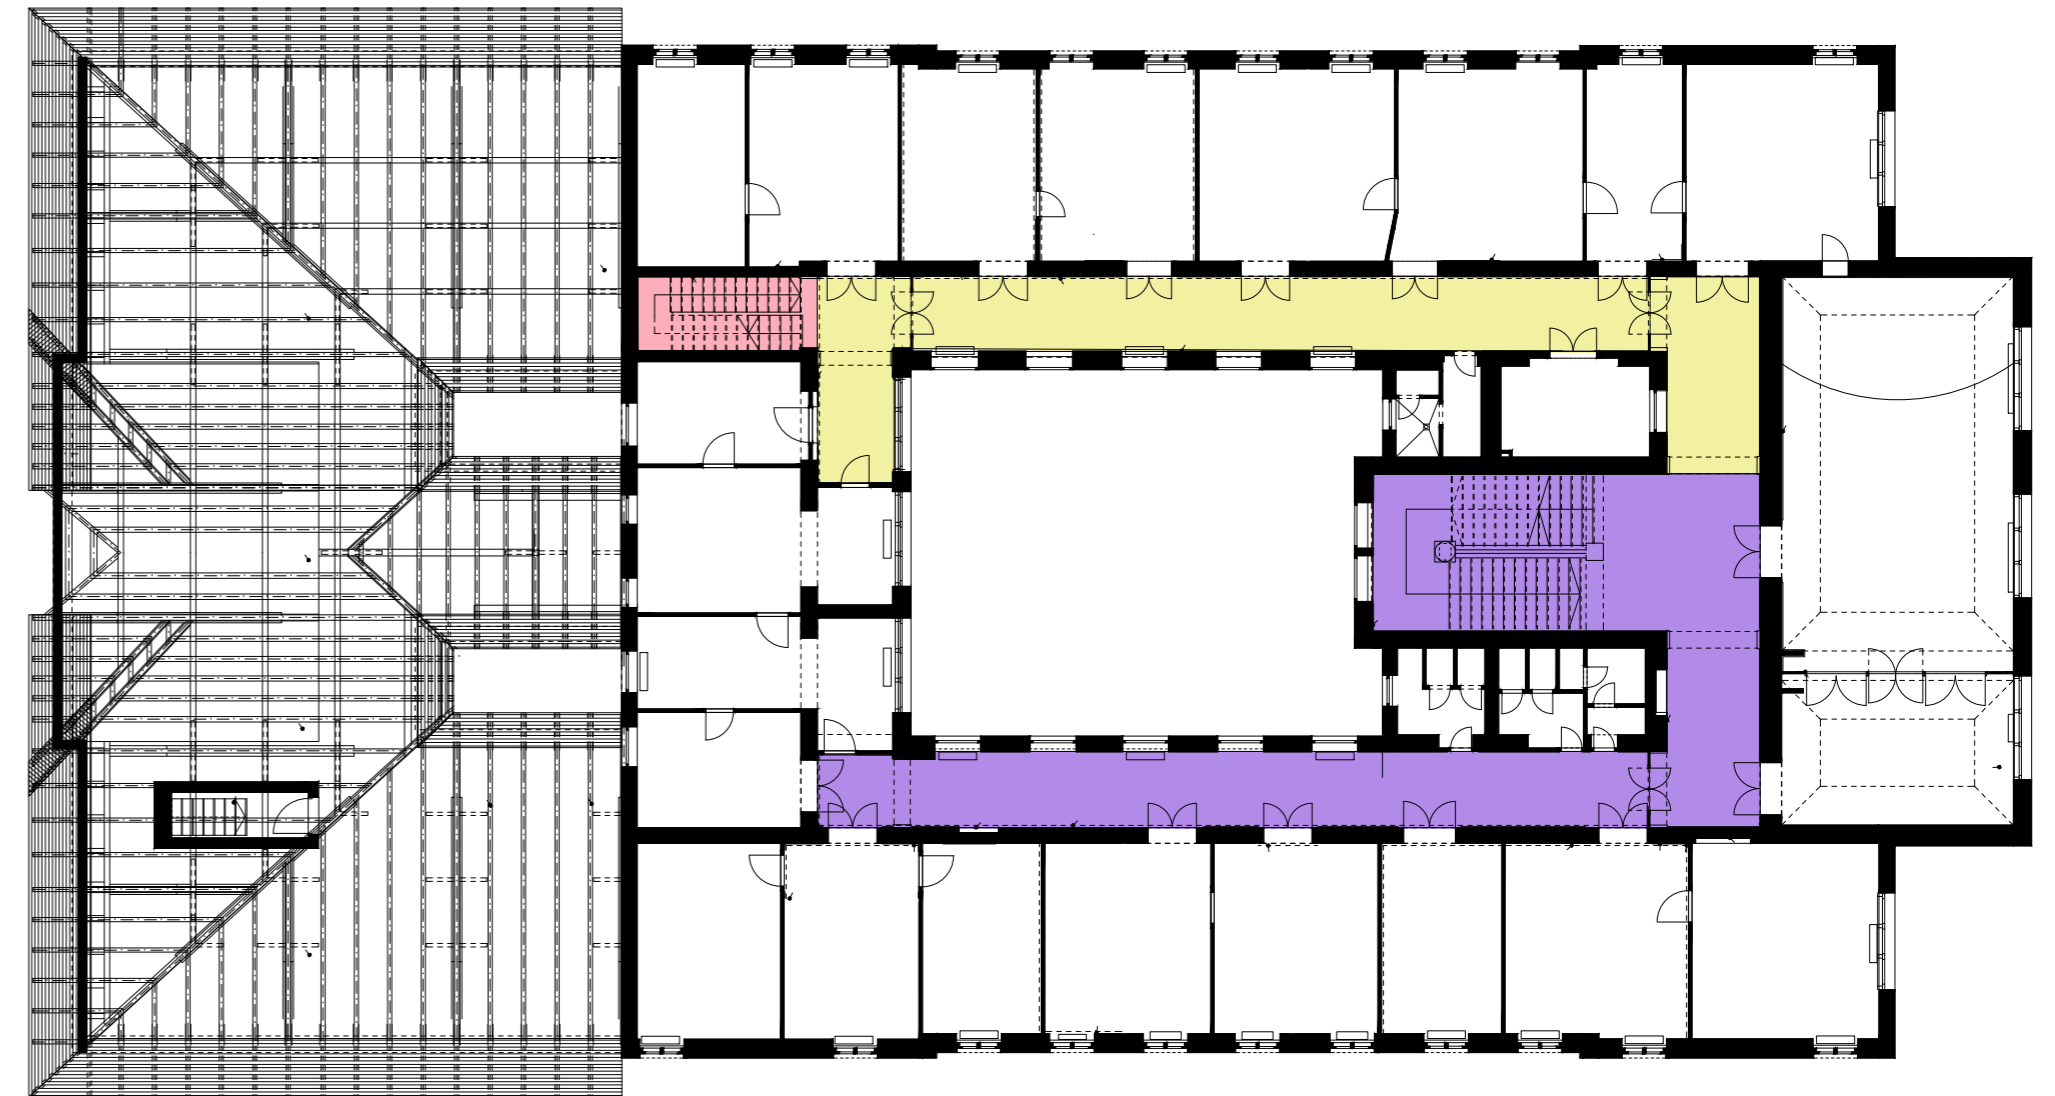

ÁTTEKINTŐ ELSŐ EMELETI ALAPRAJZ

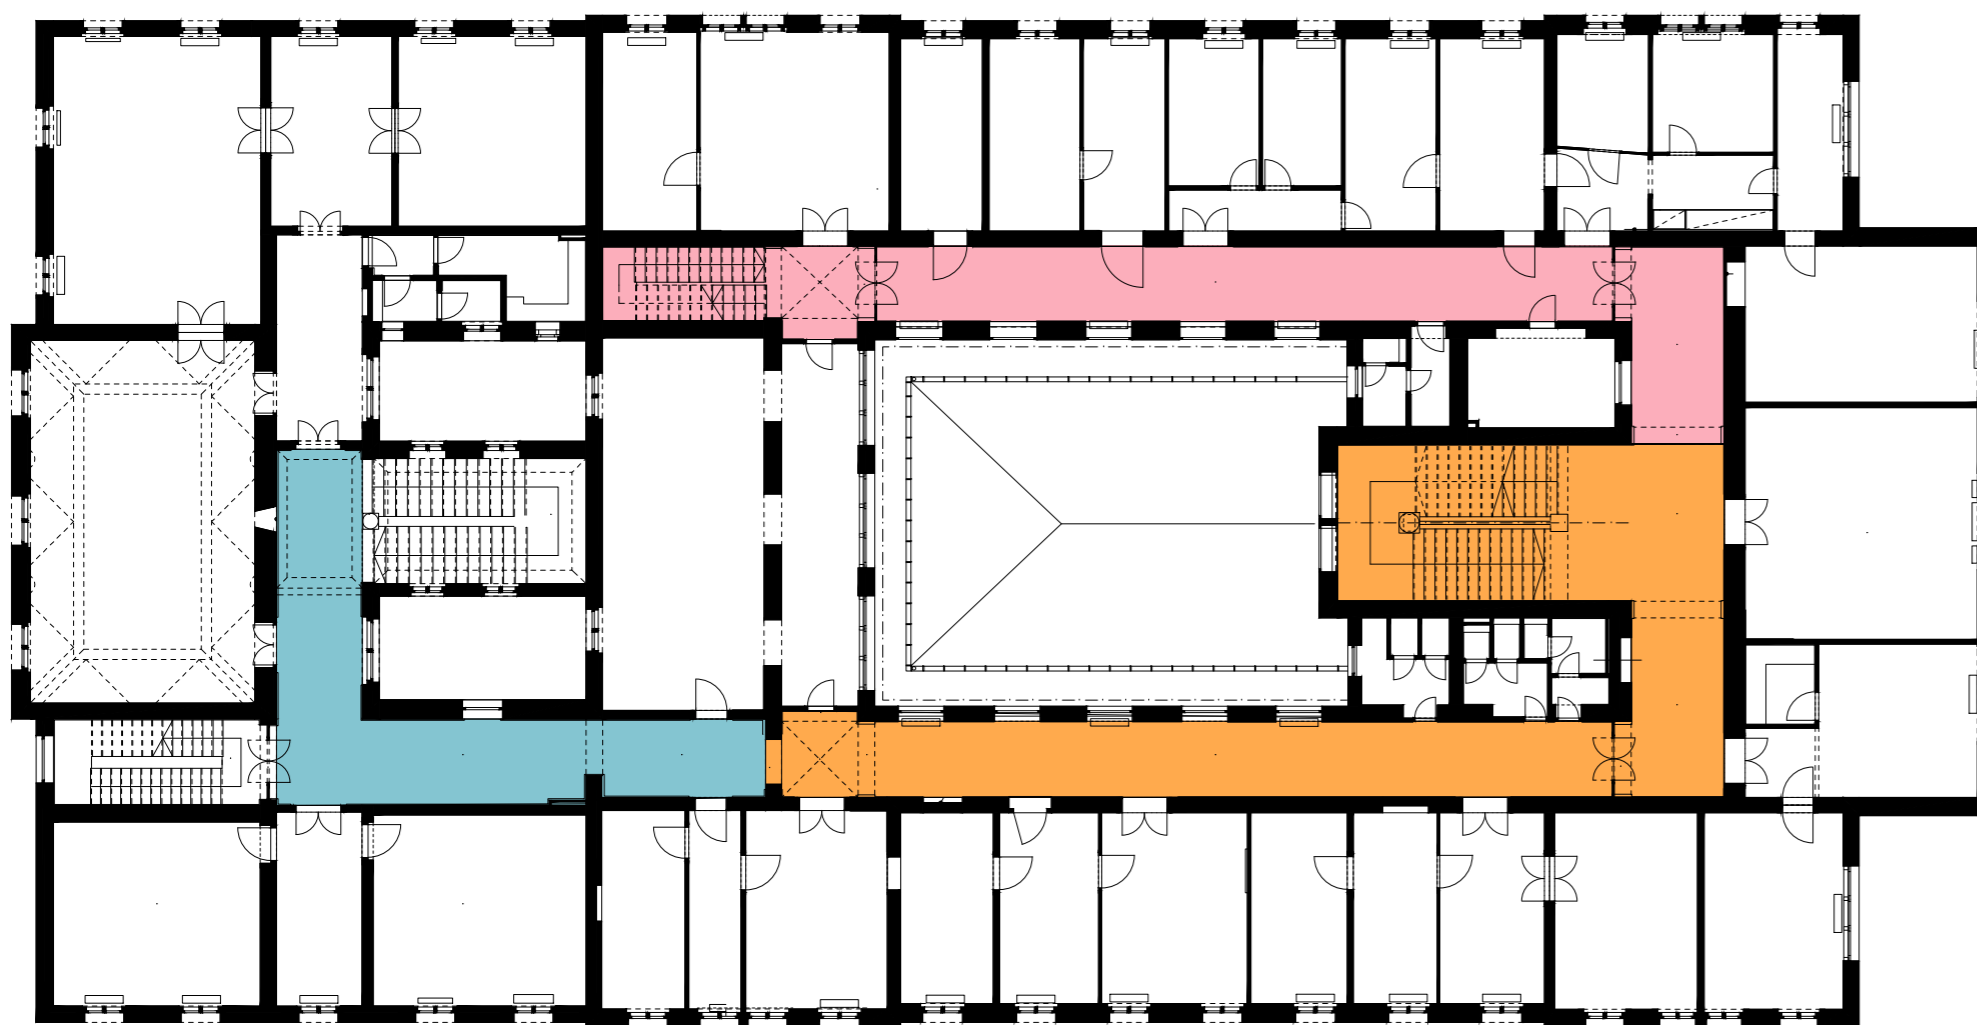

ÜTEM	~T	kezdés időpontja:	befejezés időpontja:
I. ÜTEM	~208 m ²	munkaterület átadás	40 naptári nap
II. ÜTEM	~771 m ²	július 7.	július 22. (közigazgatási szünet)
III. ÜTEM	~163 m ²	július 23.*	augusztus 12.*
IV. ÜTEM	~123 m ²	augusztus 13.*	augusztus 26.*
V. ÜTEM	~81 m ²	augusztus 27.*	szeptember 9.*
VI. ÜTEM	~76 m ²	szeptember 10.*	szeptember 23.*
VII. ÜTEM	~120 m ²	szeptember 24.*	október 8.*

III-VII. ütem 2018. július 23-tól a készültségtől függően a megadott sorrendben ütemezhető a véghatáridő betartásával, amely július 23-ától számított 90 naptári nap
* javasolt ütemezés

A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FOLYOSÓFELÚJÍTÁS ELŐZETES ÜTEMEZÉSE

ÁTTEKINTŐ ALAPRAJZOK

KÉSZÍTETTE:
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

DÁTUM:
2018. MÁRCIUS
